

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- 1)- Se ejecutará la excavación (Movimiento de Suelo) llegando al Nivel de fundación, dejando en el perímetro aprox. 2.00m como mín. desde la construcción vecina con el talud correspondiente. -
- 2)- Se marcará y se colocarán estacas cada 1.50m de distancia entre las mismas, se procederá a la excavación, pasando un paño y se realizará la 1ª ETAPA DE SUBMURACIÓN (Mampost. de Ladrillo Común de 0.30m de espesor y cimiento de hormigón) por debajo de la mampostería EXISTENTE. -
- 3)- Una vez fraguada la 1ª etapa, se procederá a la excavación, y la posterior realización de la 2ª ETAPA DE SUBMURACIÓN (Identicas Características que la anterior etapa). -


REFERENCIAS:

**Tabiques Mampostería de Ladrillos
Comunes de 0.30m x 1.50m
1.º etapa de excavación y submuración
(en modo alternado).-**

**Tabiques Mampostería de Ladrillos
Comunes de 0.30m x 1.50m
2º etapa de excavación y submuración
(en modo alternado).-**

PLANILLA DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA	804,35 m2
PLANTA 1º PISO	804,35 m2
PLANTA 2º PISO	804,35 m2
PLANTA 3º PISO	804,35 m2
PLANTA SALA DE MAQUINAS	16,42 m2
F.L.M.	8,65 m2
TOTALES	3242,47m2

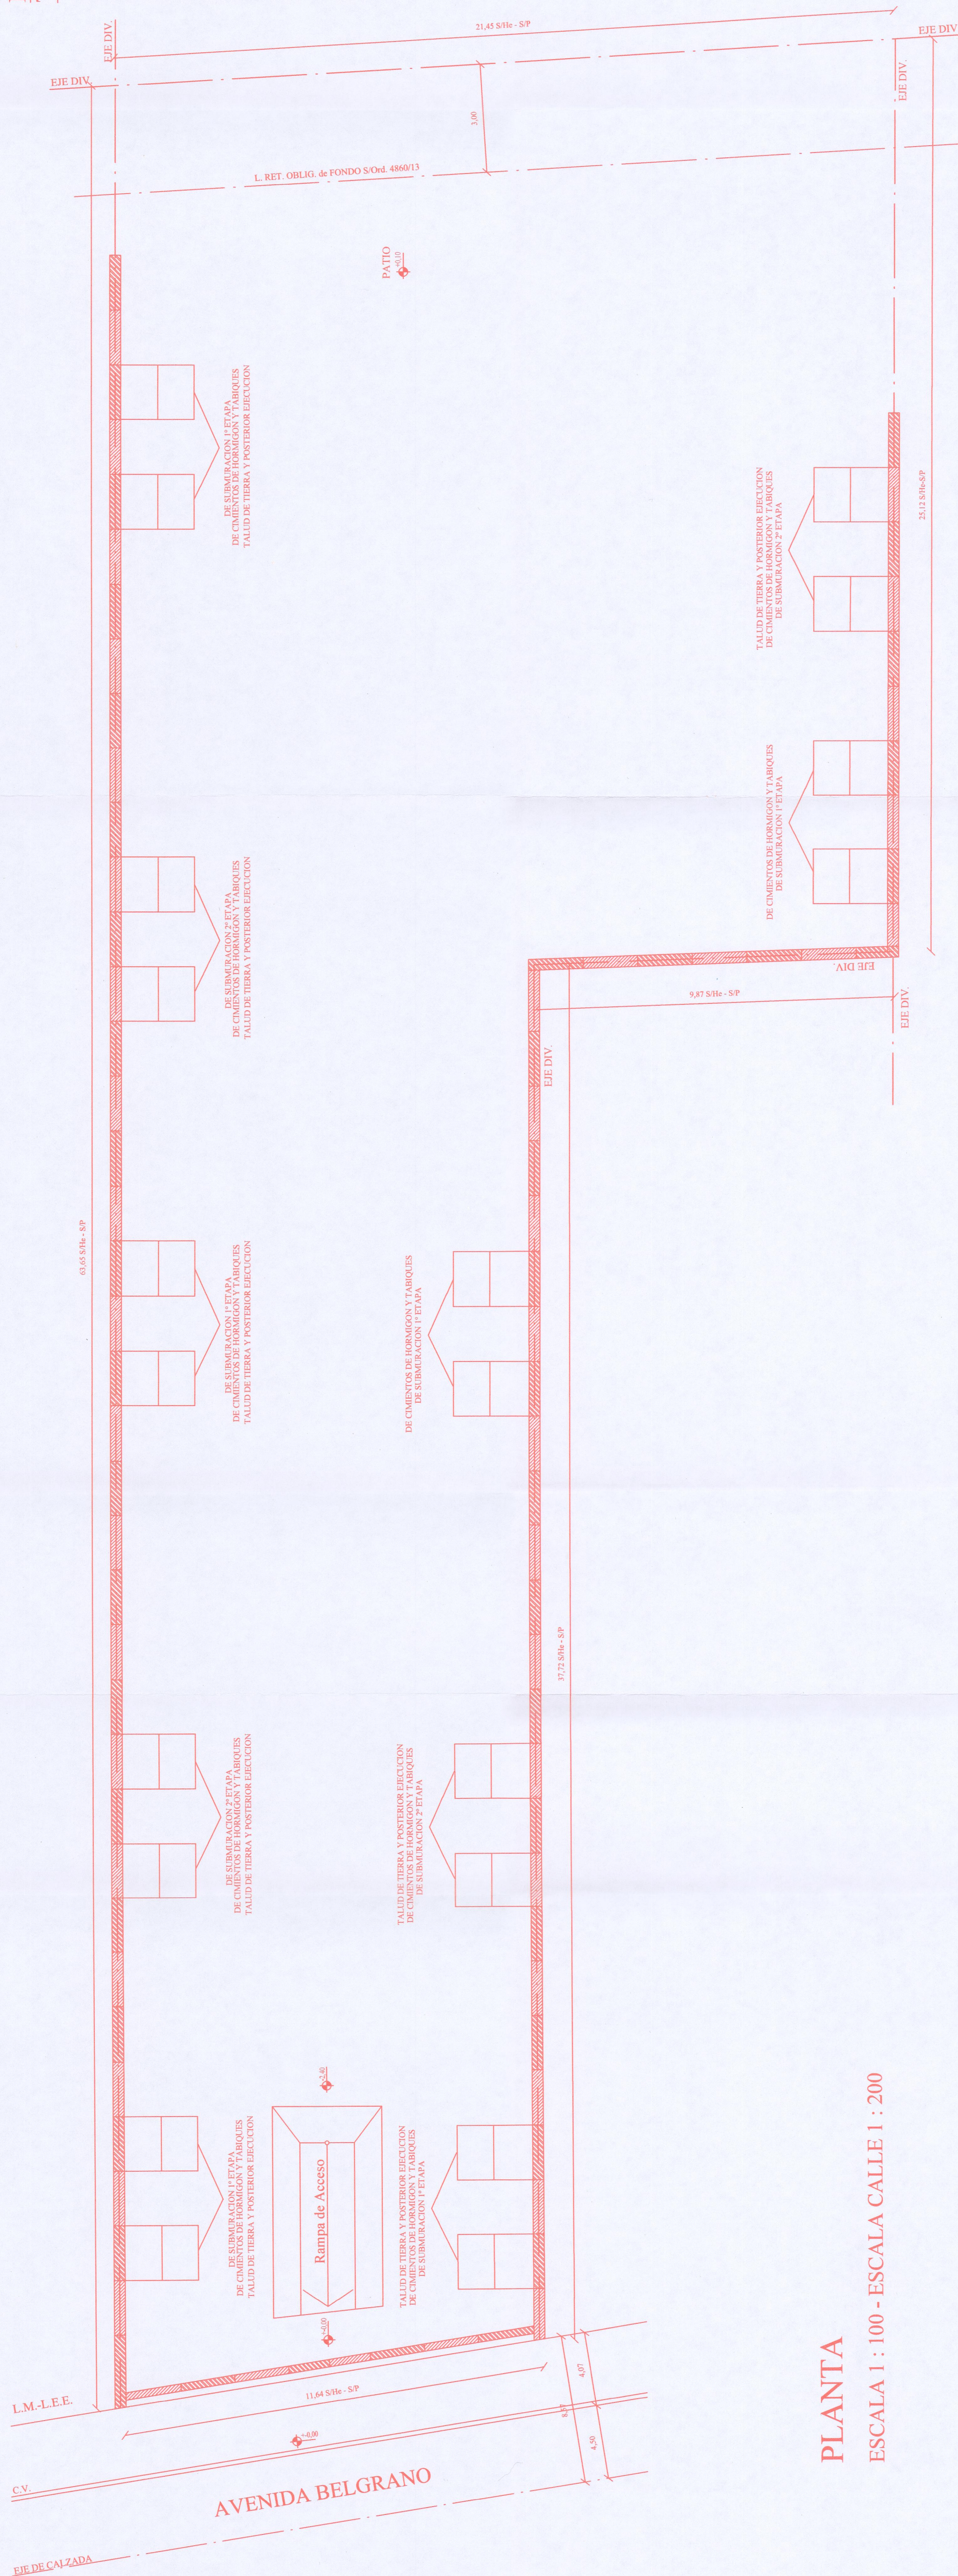

PLANTA
ESCALA 1 : 100 - ESCALA CALLE 1 : 200

[illegible]
